

교통-2	<b>안양천 횡단보도교 신설</b>				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	9,506백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

**정책목표**

- 안양천 횡단보도교 신설로 단절된 독산1동 분소지역 학생들의 통학안전 및 주민들의 접근성 개선을 통해 지역발전 활성화에 기여하고자 함

**사업개요**

- 위 치 : 안양천(금천현대아파트) ~ (안천중학교)
- 규 모 : 폭 4.5~15m, 연장 201m(보도교)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업내용 : 안양천 횡단보도교 신설
- 총사업비 : 9,506백만원(시비, 공사비 8,391, 설계비 등 276, 감리비 839)

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
안양천 횡단보도교 신설	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설계공모 시행(10%)</li> <li>• 실시설계용역 시행(10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계용역 준공(10%)</li> <li>• 시설공사 발주(10%)</li> <li>• 시설공사 시행(10%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설공사 시행(20%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설공사 시행(20%)</li> <li>• 공사준공(10%)</li> </ul>	

**연차별 투자수요 및 집행액**

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	9,506	6,331	950	950	4,200	4,200	1,181	1,181	3,175	0	0	0
안양천 횡단 보도교 신설	국 비	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	시 비	7,506	4,331	950	950	2,200	2,200	1,181	1,181	3,175	0	0	0

□ **추진실적**

- 2018.06. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2018.11. : 자문회의 및 공법선정 심사
- 2018.11. : 주민설명회 개최
- 2019.02. : 설계용역 준공
- 2019.03. : 하천점용신청 관련 서울지방국토청 협의
- 2019.04. : 안양천 횡단보도교 설치공사 발주
- 2019.05. : 공사착공
- 2019.06. : 하천점용허가
- 2019.07. : 사업계획 변경(서울시 도로계획과-9864)  
- 사업비 조정(당초 7,450백만원 → 변경 9,506백만원)
- 2019.09. : 국비(특별교부금) 20억 확보
- 2019.10. : 가도 조성 및 교량하부 기초공사 시행
- 2019.12. : 시설공사 및 건설사업관리용역 1차 준공 및 2차 발주
- 2020.01. : 시설공사 및 건설사업관리용역 2차 시행
- 2020.03. : 주탑부 기초 흙막이 가시설 작업 시행
- 2020.05. : 시설공사 3차 시행
- 2020.07~08. : 강재 주탑 및 교각 설치 완료
- 2020.10~12. : 상부 거더 제작 설치
- 2021.01~03. : 본선 난간 및 데크 설치

**[21년 2분기]**


- 2021.05.31. : 안양천 횡단보도교(금천한내교) 개통

□ **향후계획**

- 2021.07 : 공사 완료 및 시설물 인수인계

작성자	도로과장 : 진학성 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 남계동 (1804)
협업부서	기획예산과, 치수과, 독산1동	협조내용	공사 안전사고 및 민원예방
중앙정부	서울지방국토관리청(하천계획과)	서울시	도로계획과

□ 위치도

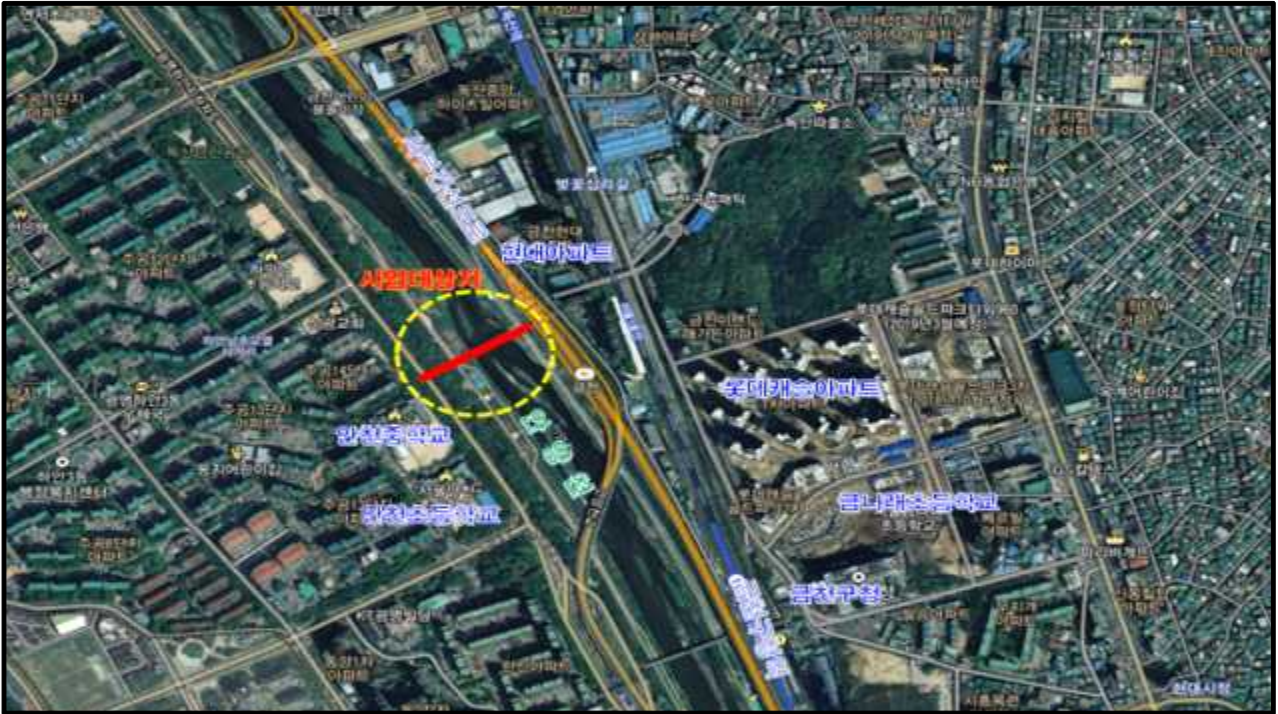

□ 조감도

