

교통-5	동서간 도로개설 추진				
추진상황	정상추진	이행률(%)	10%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	51,000백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

정책목표

- 독산동 군부대부지 내 도로개설이 완료(2016.10월말)됨에 따라 연계된 동·서간 도로개설로 지역 내 접근로 다양화 및 빗꽃로~ 시흥대로~독산로의 교통환경 개선 필요

사업개요

- 위 치 : 시흥대로 314 ~ 독산로 174
- 규 모 : 폭 20m, 연장 600m
- 총사업비 : 51,000백만원(시비, 보상비 48,640, 공사비 2,100 기타 260)

◇ 동서간 연계도로 사업개요(전체구간)
• 위 치 : 시흥대로(시흥대로 314) ~ 관악구 신림동 호암로 582
• 규 모 : 폭 20m, 연장 3,350m
• 사업기간 : 2016 ~ 2030년
• 사 업 비 : 286,164백만원(공사비 63,466, 보상비 189,921, 기타 32,777)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
동서간 연계도로 개설	서울시 도로건설 관리계획 반영요청	부시장 면담 건의	동서간 연계도로 개설을 위한 지속적 건의 및 협의		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년이전		2019년		2020년		2021년		2022년 이후	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0
벚꽃로 도로개설	시 비	51,000	0									51,000	

□ 추진실적

【18년 3분기】

- '18. 06 : 서울특별시 도로건설 관리계획 반영 요청

【18년 4분기】

- '18. 12.14 : “금천구~관악구간 동서간 연결도로” 도로개설 적정성 자문
(서울시 도로계획과)

【19년 1분기】


- '19. 01.08 : 부시장 면담 건의(구청장)

□ 향후계획

- 지속적인 정책건의 및 도로개설을 위한 협의

작 성 자	도로과장 : 진학성(1800) 도로계획팀장 : 박희원(1801) 담당 : 이현정(1802)		
협업부서	기획예산과	협업내용	예산확보
중앙정부	국토교통부(도로정책과)	서 울 시	도로계획과

□ 위치도

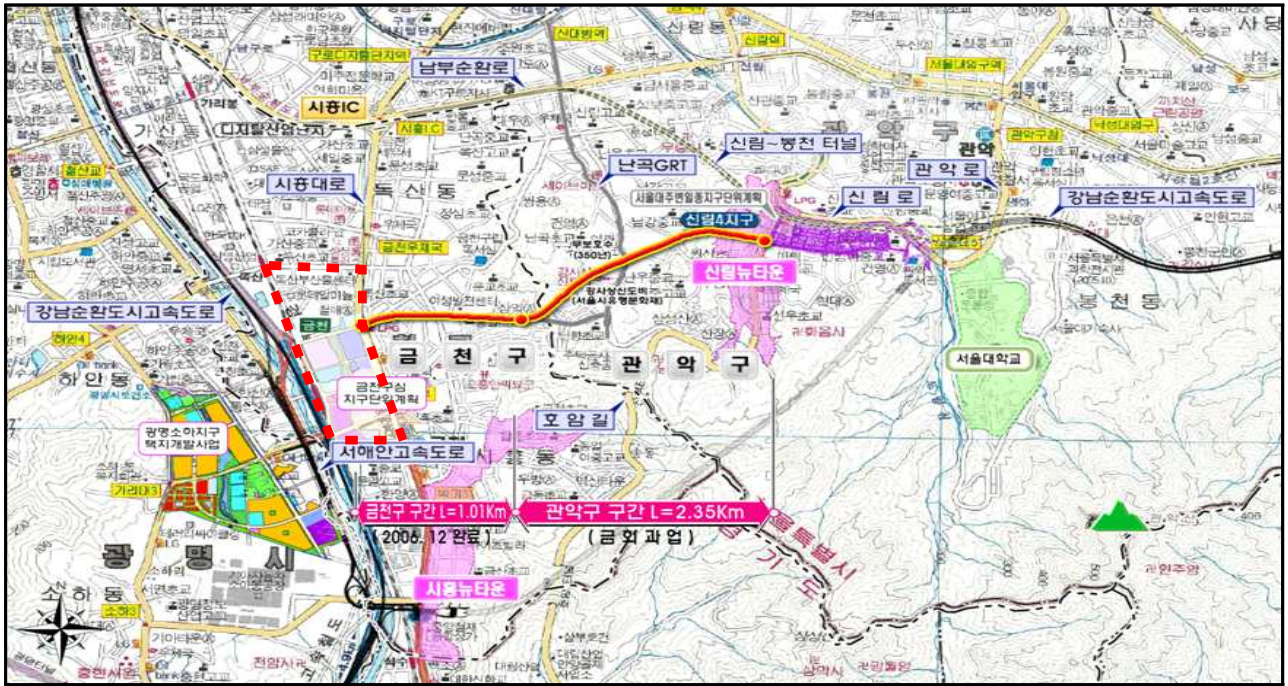

□ 현장사진

