

문화-5	금천뮤지컬스쿨 건립				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	7,146백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	문화체육과

정책목표

- 창의적 문화예술콘텐츠를 구현하는 뮤지컬 특화 시설
- 유관기관, 학교 등이 연계한 통합형 예술프로그램 실현
- 창작 작품 제작 지원을 통한 지역문화예술 활성화 기반 조성

사업개요

- 위 치 : 가산중학교 (금천구 시흥대로115길 48)
- 규 모 : 지상4층, 연면적 1,614 m^2 내외
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2021. 02.
- 주요기능 : 뮤지컬 교육, 제작, 공연을 통한 문화공간조성
- 대 상 : 뮤지컬에 관심 있는 주민 누구나
- 총사업비 : 6,496백만원(국비2,500 시비(특교)1,500 구비2,496)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천 뮤지컬스쿨 건립	· 행정사전절차 · 설계공모	· 기본, 실시설계 · 공사준비	· 공사추진	· 공사완료 · 뮤지컬센터 운영	· 뮤지컬센터 운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	5,146.4	4,491.1	2,440	2,440	560	560	611.4	611.1	885	880	650	0
단위사업 기재	국 비	1,500	1,500	940	940	560	560	0	0	0	0	0	0
	시 비	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	구 비	2,146.4	1,491.1	0	0	0	0	611.4	611.1	885	880	650	0

※ 2018년 이전 집행예산 : 국비 1,000백만원, 구비 1,000백만원

□ 추진실적

【18년 3기】

- 설계관련 의견수렴 및 TF운영(금천구) : '18. 7. ~11.

〈TF추진 현황〉

- ◆ TF구성 : 관계기간 실무자 및 외부 전문가(건축, 공연장, 뮤지컬) 등 15명
- ◆ 운영 횟수 : 5회 내외
- ※ 설계 관련 벤치마킹 시설 : 구로중학교, 서울종합예술학교, 한국종합예술학교

【18년 4분기】

- 설계공모 공고 및 심의 : '18. 9. ~ 12.

【19년 1분기】

- 기본설계 : '19. 1. ~ 4.

【19년 2분기】

- 실시설계 : '19. 4. ~ 8.

【19년 3분기】

- 실시설계 조정 : '19. 10.

【19년 4분기】

- 서울시교육청 일상감사 및 조달청 공사계약 의뢰 : '19. 11.

【20년 1분기】

- 서울시교육청 공사계약 체결 : '20. 2.
- 서울시교육청 공사착공 : '20. 3.

【20년 2분기】

- 운영계획 수립 관련 간담회 : '20. 5.
- 운영계획 관련 용역계약 준비 : '20. 6.
- 공사추진(남부교육지원청) : '20. 3. ~ '21. 2.

【20년 3분기】

- 뮤지컬스쿨 운영방안 연구조사 용역 : '20. 7. ~ 9.

【2021년】

- 공사완공(남부교육지원청) : '21. 2.
- 임기제공무원 채용 : '21. 1. ~ 4.
- 자산취득 및 개관 준비 : '21. 3. ~ 7.
- 자문위원회 구성 및 운영 : '21. 5.
- 금천뮤지컬센터로의 명칭 확정 : '21. 5.
- 금천뮤지컬센터 운영계획 수립 : '21. 6.
- 금천뮤지컬센터 개관 : '21. 7.

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440)	팀장 : 최경밀 (1441)	담당 : 권우경 (1446)
협업부서	교육지원과	협조내용	학교 연계 프로그램 협업
중앙정부	문화체육관광부 문화예술교육과	서울시	문화본부 문화시설과

□ 현장 및 공간 사진

금천뮤지컬센터 전경



1층 로비




2층 창작공간



3층 분장대기실



3층 로비

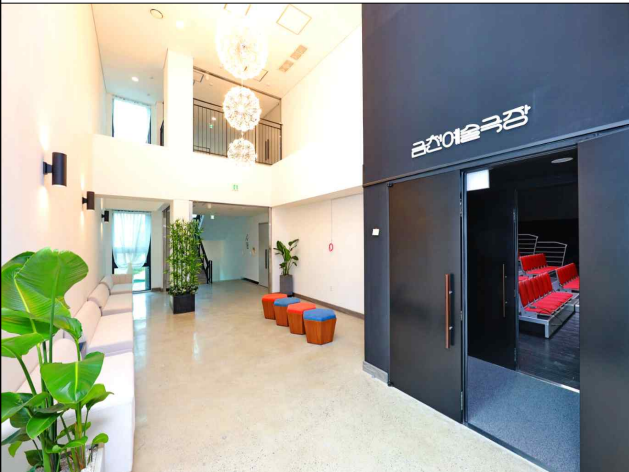

3층 금천예술극장

