

문화-6	서서울미술관 건립				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	32,060백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	문화체육과

정책목표

- 문화시설이 부족한 우리구에 시립미술관을 유치하여 문화 균형발전 도모
- 4차 산업혁명시대에 걸맞은 청소년 과학·예술 융복합 교육과 시민참여형 공공미술을 통한 미술관 접근성 증대 및 미술 문화 저변 확대

사업개요

- 위 치 : 독산동 1151번지 일대 (금나래중앙공원 내)
- 규 모 : 지하 2층 ~ 지상 1층 (연면적 7,342㎡)
- 사업기간 : 2015. ~ 2023.12.
- 총사업비 : 32,060백만원('20년 사업예산 : 1,304백만원)
- 운영방식 : 서울특별시 직접운영

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
서서울미술관 건립	설계공모 비	설계공모	실시설계	실시설계 공사착공	공사추진	준공 및 관

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	31,997	2,930	155	155	1,521	1,521	1,304	1,254	2,465	0	26,552	0
서서울미술관 건립	시 비	31,997	2,930	155	155	1,521	1,521	1,304	1,254	2,465	0	26,552	0

※ 총사업비: 32,060백만원(2018년 이전 투자액: 63백만원)

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 서울총괄건축가 자문 : 2018.10.19.
- 서울시 간담회 (설계공모 관련), 사업적정성 검토의뢰(도시기반시설본부) : 2018.11.
 - 미술관 건립영역 : 공원일부 → 공원 전체
 - 주차장 증설 반영 요청(1차)
- 적정성 검토(도시기반시설본부) : 2018.11.
- 건축정책위원회 상정(도시공간개선단) : 2018.12.14.

【19년 1분기】

- 서성만 문화시설추진단장 등 방문 : 2019.3.7.
 - ↳ 설계시 주차장 증설 반영 요청(2차)

【19년 2분기】

- 설계시 주차장 증설 반영 요청(3차) : 2019.5.
- 국제 설계공모 용역업체 선정 : 2019.6.
- 설계관련 자문위 운영 : 2019.1.~6.

【19년 3분기】

- 서울시 도시공원위원회 상정 : 2019.10.
 - ↳ 원안가결(자문결과 당초 미술관건립영역에 설계)

【19년 4분기】

- 서울시 도시공원위원회 관련 박물관과, 도시공간개선단 업무협의

【20년 1분기】

- 설계지침 과업지침서 확정 및 사전절차 이행 : 2019.10.~2020. 2.
- 공공건축심의위원회 사전절차 이행여부 심의 통과 : 2020. 3.

【20년 2분기】

- 국제지명현상공모 추진 : 2020. 4.~2020. 6.
- 국제지명현상공모 당선작 선정 : 2020. 6.

【20년 4분기 ~ 21년 4분기】

- 설계용역 계약, 기본설계 및 실시설계 : 2020.11.~2021.10.
- 서서울미술관 기본설계 관련 협의 : 2021.2.~6.


□ 향후계획

【21년 4분기 ~ 23년 4분기】

- 건축 및 전시 공사 : 2021.11.~2023.11.
- 개관 : 2023.12.

작성자	문화체육과장 : 유민석 (1440) 팀장 : 최경밀 (1440) 담당 : 나현선 (1443)		
협업부서	공원녹지과, 행정지원과 도시계획과	협조내용	미술관 건립 부지 관련 협조 도시계획 변경(필요시)
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화본부 문화시설추진단 박물관과 서울시립미술관

현장사진

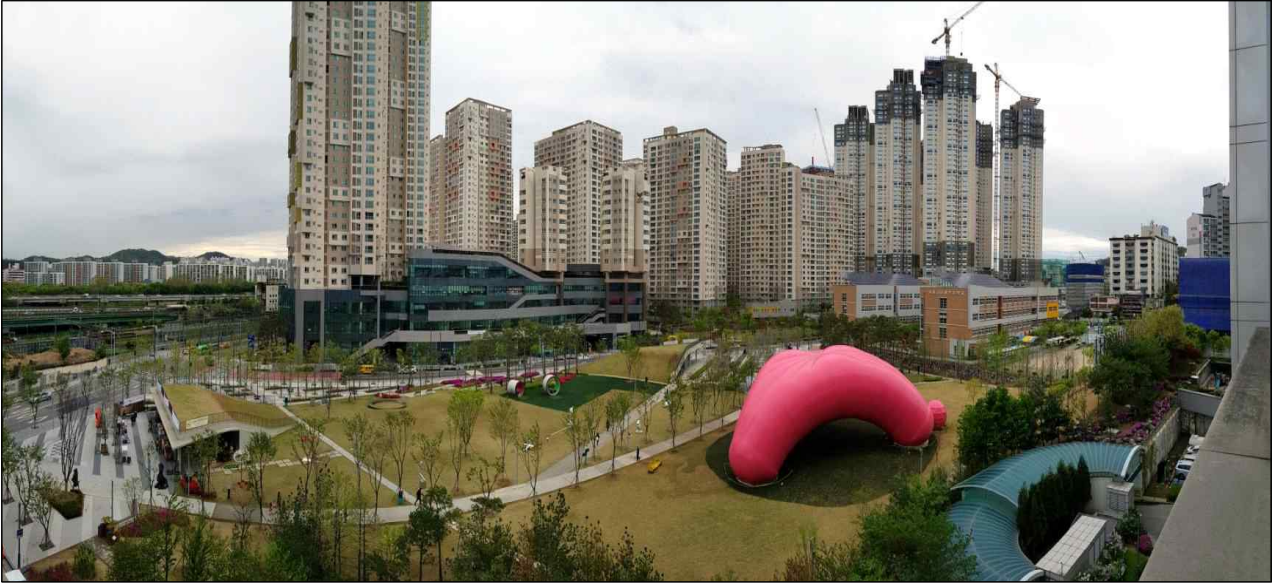

조감도

