

문화-1	숲속작은도서관 건립 조성				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	545백만원	사업유형	신규/자체/건립	추진부서	문화체육과

정책목표

- 자연훼손을 최소화하고 주민의견을 최대한 반영하여 자연 친화적으로 건립
- 구립 및 작은도서관, 학교, 마을, 어린이집 등 유관기관 연계 운영
- 다양한 독서프로그램 운영과 작은음악회, 전시회 등 행사개최 장소 활용

사업개요

- 사업위치 : 독산동 373 (감로천생태공원 야외학습장)
- 사업규모 : 연면적 61.03 m^2
- 사업기간 : 2019. 3월~12월
- 사업내용
 - 숲 속과 어우러지는 도서관 및 야외 테라스 구축
 - 독서활동가, 자원봉사자, 마을사서 등 탄력적 배치
 - 생태 자연친화 도서관으로 특화하여 상호 운영 활성화 도모
- 총사업비 : 545백만원 (건립 : 216백만원, 운영 : 329백만원, 전액구비)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
숲속작은 도서관 건립	사업타당성 내부검토	부지선정 설계 및 건립	운영	운영	운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	545	245	0	0	245	245	100	0	100	0	100	0
숲속작은 도서관 건립	구 비	545	245	0	0	245	245	100	0	100	0	100	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

- 숲속작은도서관 건립을 위한 주민설문조사 실시 (2018.10)
 - 전체 조사자의 70%가 건립을 찬성하며 주민편익시설 확충을 희망하는 것으로 나타남.
 - 반대 의견으로 '자연 훼손' 우려가 가장 많아 자연 훼손을 최소화하는 방안으로 건립 필요.

【19년 1분기】


- 대상지 선정 (2019.2월)
 - 감로천생태공원 상층부, 야외학습장 약 150m² 부지
- 숲속도서관 설계개념 결정 (2019.3월)
 - 1안 : 경사지 높이차를 이용한 숲속도서관 (결정)
 - 2안 : 동그랗고 투명하고 이색적인 구조 숲속도서관

【19년 2분기】


- 설계용역 계약 (2019.4월 ~ 6월)
 - 설 계 사 : 큐브디자인건축사사무소 (경기도 김포시)
 - 설계금액 : 14,630천원

○ **부지측량** (2019.4월)

- 측량장소 : 감로천 생태공원
- 완평지 및 급경사지 약 150m²로 구성 (평지 약70m², 경사지 80m²)

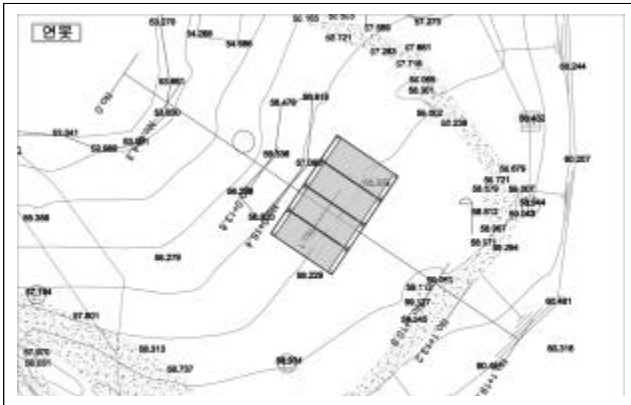


등고선

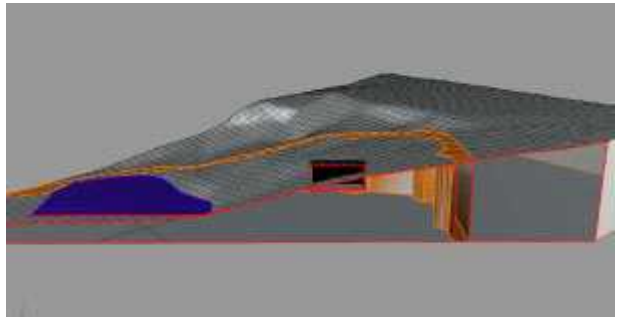


3D투시도

○ **기본설계 완료** (2019.6월)


- 컨테이너(6m×2.4m) 4개동 연결 : 61.03m²(약18평형)
- 경사지 절토 후 옹벽 및 기초 시공
- 전면부 유리로 채광강조, 노천극장과 연계
- 옥상 테크 및 난간 설치, 조망공간으로 활용

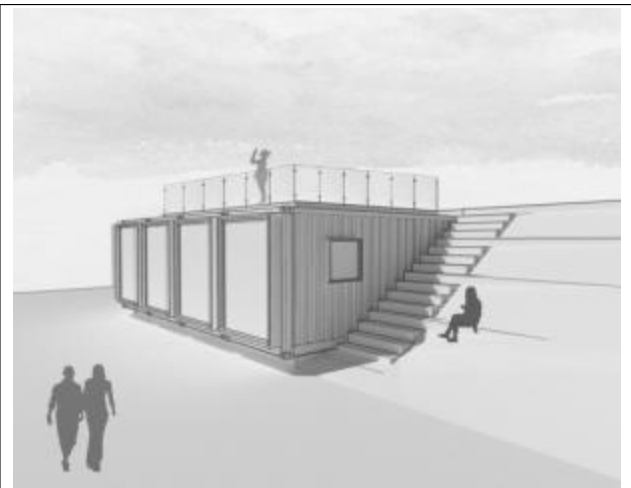


조감도

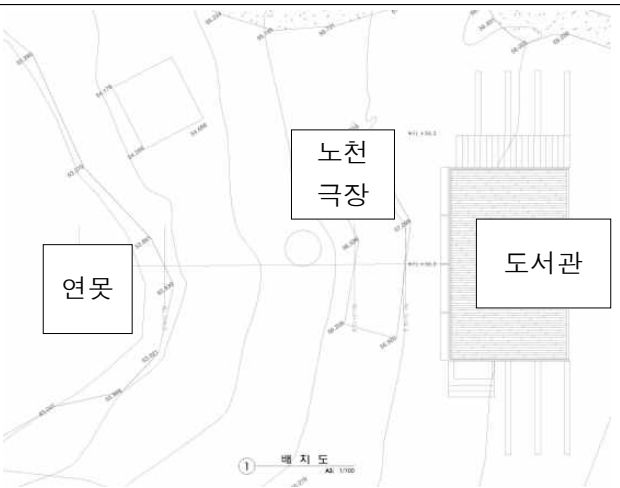

배치도

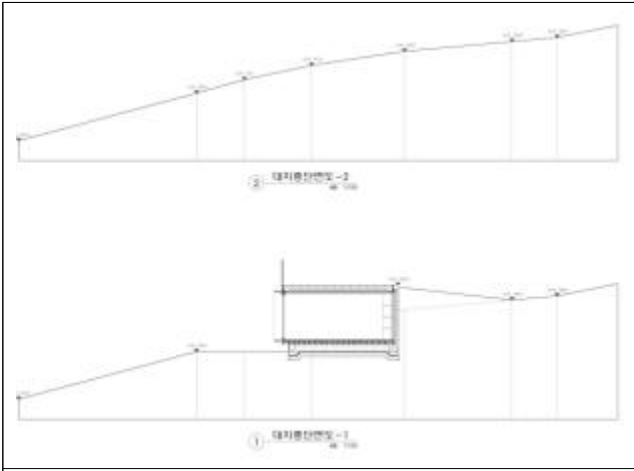

종단면도

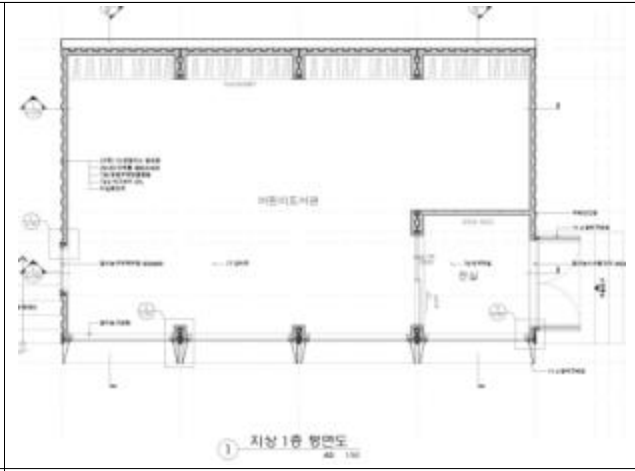

평면도



【19년 3~4분기】

- **공원 내 시설물 설치에 관한 법규 검토** (2019.9월)
 - 가설건축물 설치 관련 제규정 검토
 - 유관부서(공원녹지과, 건축과 등) 협의 및 일상감사 실시
- **숲속작은도서관 공사발주** (2019.10월)
 - 공사기간 : 2019.10월 ~ 2019.12.13.
 - 사업위치 : 독산동 373 (감로천생태공원 야외학습장)
 - 사업규모 : 연면적 61.03m², 높이 3.0m
 - 구조 및 마감 : 경량철골조(컨테이너), 우레탄도장
- **숲속작은도서관 전담운영자 채용** (2019.11월)
 - 운영시간 : 매주 화요일~토요일 09:00~18:00 (월요일 휴관)
 - 근무인원 : 1명 (기간제근로자)
 - 사업내용 : 숲속도서관전시관 운영 (도서정리, 방문자 안내, 프로그램 기획)
- **숲속작은도서관 명칭확정 ‘책달샘’** (2019.12월)
- **숲속작은도서관 개관식 개최** (2019.12.24.)

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440)	팀장 : 주은경 (2851)	담당 : 조성익 (2852)
협업부서	건축과, 공원녹지과	협조내용	가설건축물 및 공원외시설 점용허가
중앙정부	해당없음	서울시	해당없음

□ 위치도



□ 현장사진

