

환경-2	<b>서울둘레길 입구 무인보관함 설치</b>				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	3백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	공원녹지과

## □ 정책목표

- 서울둘레길 등산로 초입은 개인 및 단체 이용객이 많아 보관함 설치시 이용객 편의 제공 효과가 큼
- 노출빈도가 많은 지역에 新서비스 도입으로 금천구를 방문하는 외부 주민들에게 금천구 선도적 이미지 제고

※ 현재 서울시 및 25개 자치구 등산로변 보관함 설치 현황 '없음'

## □ 사업개요

- 위 치 : 시흥3동 산1-4번지(서울둘레길 만남의 광장 화장실 옆)
- 기 간 : 2019. 9. ~ 10.
- 내 용 : 무인 물품보관함(4열 36함) 1개소, 비가림막 설치
  - 규 격 : 폭0.31m×높이0.35m×깊이0.46m / 36함
  - 소 재 : 특수강화플라스틱(야외설치 가능)
  - 설 치 : 조립식
  - 잠금방식 : 비밀번호
- 소요예산 : 3,000천원(국비 / 만남의 광장 조성사업 예산활용)
- 산출근거 : 약180명 x 20% = 36함
  - 아파트의 경우 세대수 대비 20~25% 보관함 수요 산정
  - 등산로변 일 이용자 약180명으로 아파트와 동일 비율 적용

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
무인보관함 설치	-	보관함 설치	운영	운영	운영

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
무인보관함 설치	구 비	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

【19년 2분기】

- '19. 4. 12. : 만남의광장 실시설계에 무인보관함 반영


【19년 4분기】

- '19. 10. 4. : 호암산숲길공원 화장실옆 설치완료

□ 향후계획

- '19. 10. ~ : 유지관리 시행

□ 위치도 및 설치사진

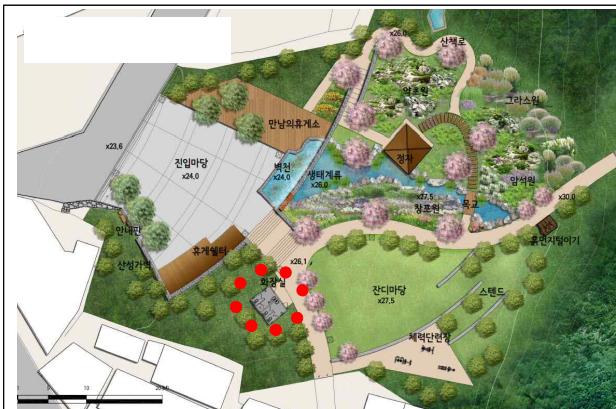

호암산숲길공원 화장실 옆



설 치 사 진

작 성 자    공원녹지과장 : 배남현(1650)    팀장 : 강종희 (1661)    담당 : 송대승 (1663)
