

도시재생-7	감로천 생태공원 활성화				
추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	8,969백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	공원녹지과

□ 정책목표

- 관악산도시자연공원 감로천생태공원 일대 주민이용 집중지역과 생태보전지역에 대한 공원정비 방안 마련 등 기본계획을 수립하고, 주제별 맞춤형 공원으로 조성하여 주민이용 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 독산4동 373일대(시유지)
- 규 모 : 약 59,053㎡
- 사업내용 : 감로천 생태공원, 금천체육공원 일대 주제별 공원조성
- 총사업비 : 8,969백만원(시비)

[용역 추진개요]

- 용역명 : 관악산도시자연공원 정비 기본계획용역 수립 용역
- 용역기간 : 2020. 4. 29. ~ 2021. 6. 22.
- 용역금액 : 65백만원(시비)
- 과업내용 : 공원조성 마스터플랜 수립 및 공원조성 계획 변경 등

□ 연차별 추진계획

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
생태도시 조성	-	-	기본계획 용역시행	단위사업 시행	

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구분	재원별	연차별 투자수요 및 집행액											
		합계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	8,969	0	0	0	0	0	100	0	3,500	0	5,369	0
생태공원	시비	8,969	0	0	0	0	0	100	0	3,500	0	5,369	0

□ 추진실적

【2020년 1분기】

- '20. 3. : 기본계획 수립 용역 추진계획 수립
- '20. 3. : 기술용역타당성 심사(市 기술심사담당관)
- '20. 3. : 예산 재배정 요청(市 공원조성과)

【2020년 2분기】

- '20. 4. 29. : 관악산도시자연공원 기본계획 용역 착수

【2020년 3분기】

- '20. 7 ~ 9. : 관악산도시자연공원 기본계획 용역 시행

【2020년 4분기】

- '20. 10. 30. : 용역보고회 개최

【2021년 1분기】

- '21. 2. : 금천배수지 구조안전진단

【2021년 2분기】

- '21. 6. ~ 7. : 여론조사 용역 시행


□ **향후계획**

- '21. 8. : 조성계획 변경
- '21. 9. : 기본계획 수립 용역 완수
- '21. 9. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 시행
- '22. 1. ~ 8. : 공사 시행

□ **협업사항**

- 서울시(푸른도시국) : 공원조성계획 변경, 사업비 예산 확보
- 시의원 : 사업관련 市 예산확보 등

□ **위치도(감로천생태공원, 금천체육공원 일대)**

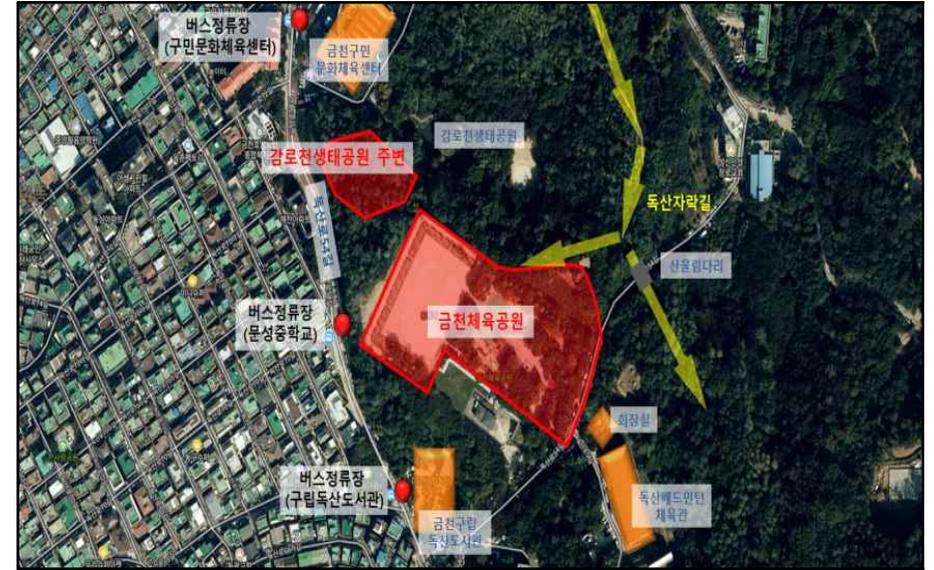

□ **현황사진**



작성자	공원녹지과장 : 배남현 (1650)	공원팀장 : 이준근 (1651)	담당 : 송대승(1653)
협업부서	도시계획과	협조내용	2040 금천구 도시종합관리계획 수립용역 자료 공유
중앙정부		서울시	푸른도시국
