

환경-10	<b>저층주거지 공중케이블 집중 정비</b>				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	8,132백만원	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	건설행정과

**정책목표**

- 도시미관을 훼손하고 구민생활에 불편을 주고 있는 불량 공중선에 대해 체계적으로 정비하여 구민생활 불편을 최소화 하고자 함

**사업개요**

○ **추진방향**

- 도시재생사업 추진 지역 우선 정비
- 저층 주거 밀집지역 중심의 집중정비로 정비효과 거양
- 「공중케이블 정비 가이드라인」 준수로 철저한 정비시행

○ **사업기간 : 2018. ~ 2022년**

○ **사업대상(2021) : 시흥5동 주 권역(도시재생사업 추진지역 포함)**

- 금하로 24길 3 ~ 독산로8나길 45 일대

○ **총사업비 : 8,132백만원**

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
공중케이블 정비	2개 구역 (독산3·4동)	3개 구역 (시흥1·4동)	3개 구역 (독산1동 지역)	1개 구역 (시흥5동 지역)	3개 구역 (독산동 지역)

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	8,132	5,612	2,090	2,090	1,703	1,703	1,819	1,819	1,260	0	1,260	0
공중케이블 정비	기타 (한전 및 통신사)	8,132	5,612	2,090	2,090	1,703	1,703	1,819	1,819	1,260	0	1,260	0

## □ 추진실적

### 【18년 3·4분기】

- 2018. 5.~12월 : '18. 공중케이블 정비사업 시행
  - 정비지역 : 독산3동(남문시장 주변), 독산4동(맞나는 거리 주변)
- 2018. 11월 : '19. 공중케이블 정비사업 대상지역 실태조사 실시
- 2018. 12월 : '19. 공중케이블 정비사업 대상지역 승인요청(구→서울시)

### 【19년 1분기】

- 2019. 3월 : '18. 공중케이블 정비사업 완료

### 【19년 2분기】

- 2019. 4. 26. : '19. 공중케이블 정비사업 대상지역 승인(서울시→구)
- 2019. 5. 29. : '19. 공중케이블 정비사업 추진계획 수립
- 2019. 6월 : '19. 공중케이블 정비사업 착공계 제출(구→서울시)

### 【19년 3분기】

- 2019. 7.~9월 : '19. 공중케이블 정비사업 추진
  - 정비지역 : 시흥1동(금빛공원 주변), 시흥4동(산장어린이공원 및 시흥4동 주민센터 주변)

## 【19년 4분기】

- 2019. 11. 19. : '20. 공중케이블 정비사업 예산 배정(서울사→구)
- 2019. 11. 29. : '20. 공중케이블 정비구역 실태조사 계획 수립
- 2019.11.~12월 : '20. 공중케이블 정비구역 실태조사 진행

## 【20년 1분기】

- 2020. 1월 : '20. 공중케이블 정비구역 실태조사 및 구역선정 완료  
- 정비지역 : 독산1동 도시재생사업 【금하마을(독산동 1100번지 일대),  
복숭아마을(독산동147-20번지 일대), 말미마을(독산동 1009번지 일대)】
- 2020. 2월 : '20. 공중케이블 정비사업 대상지역 승인요청(구→서울시)

## 【20년 2분기】

- 2020. 4월 : '20. 공중케이블 정비사업 대상지역 승인(서울사→구)
- 2020. 6월 : '19. 공중케이블 정비사업 준공검사 및 준공처리
- 2020. 6. 30. : '20. 공중케이블 정비사업 추진계획 수립

## 【20년 3분기】

- 2020. 7월 : '20. 공중케이블 정비사업 착공계 제출
- 2020. 7.~10월 : '20. 공중케이블 정비사업 시행(공정률 25%)

## 【20년 4분기】

- 2020. 10.~12월: '20. 공중케이블 정비사업 시행(공정률 100%)

## 【21년 1분기】

- 2021. 2월 : '21. 공중케이블 정비사업 예산 배정(서울사→구)
- 2021. 3월 : '21. 공중케이블 정비구역 실태조사 및 구역선정 완료  
- 정비지역 : 시흥5동 주 권역(도시재생사업 구역 포함)  
【금하로24길 3 ~독산로8나길 45 일대】

## 【21년 2분기】

- 2021. 5. 13 : '21. 공중케이블 정비사업 추진계획 수립

### □ 문제점 및 대책

- 공중케이블 정비 후 재 난립 문제 발생
  - 정비 완료지역에 대한 사후관리 철저
    - 완료지역에 대한 주기적 점검시행으로 정비사항 발견 시 전파관리소에 협조 요청하여 해당업체에 대한 시정명령 및 과태료 부과 등을 통한 재발 방지추구
- 통신사업자 개별정비 위주로 진행되어 정비 효과 미흡
  - 대표사업자 총괄 하에 전체 통신사업자 합동정비 기간 운영

### □ 향후계획



- 2021. 7.~10월 : '21. 공중케이블 정비사업 시행
- 2021. 11월 : '22. 공중케이블 정비사업 예산 배정(서울시→구)
- 2021.11.~12월 : '22. 공중케이블 정비구역 실태조사 진행

### □ 협업사항

- 동 주민센터 : 정비대상 지역 선정 시 주민의견 수렴 및 사업 홍보

작성 자	건설행정과장 : 박재완 (1570) 팀장 : 조성철 (1571) 담당 : 유정열 (1577)		
협업부서	동 주민센터	협업내용	사업 홍보 및 주민의견 수렴
서울시	보행정책과	기타	한전, 각 통신사

# □ 위치도

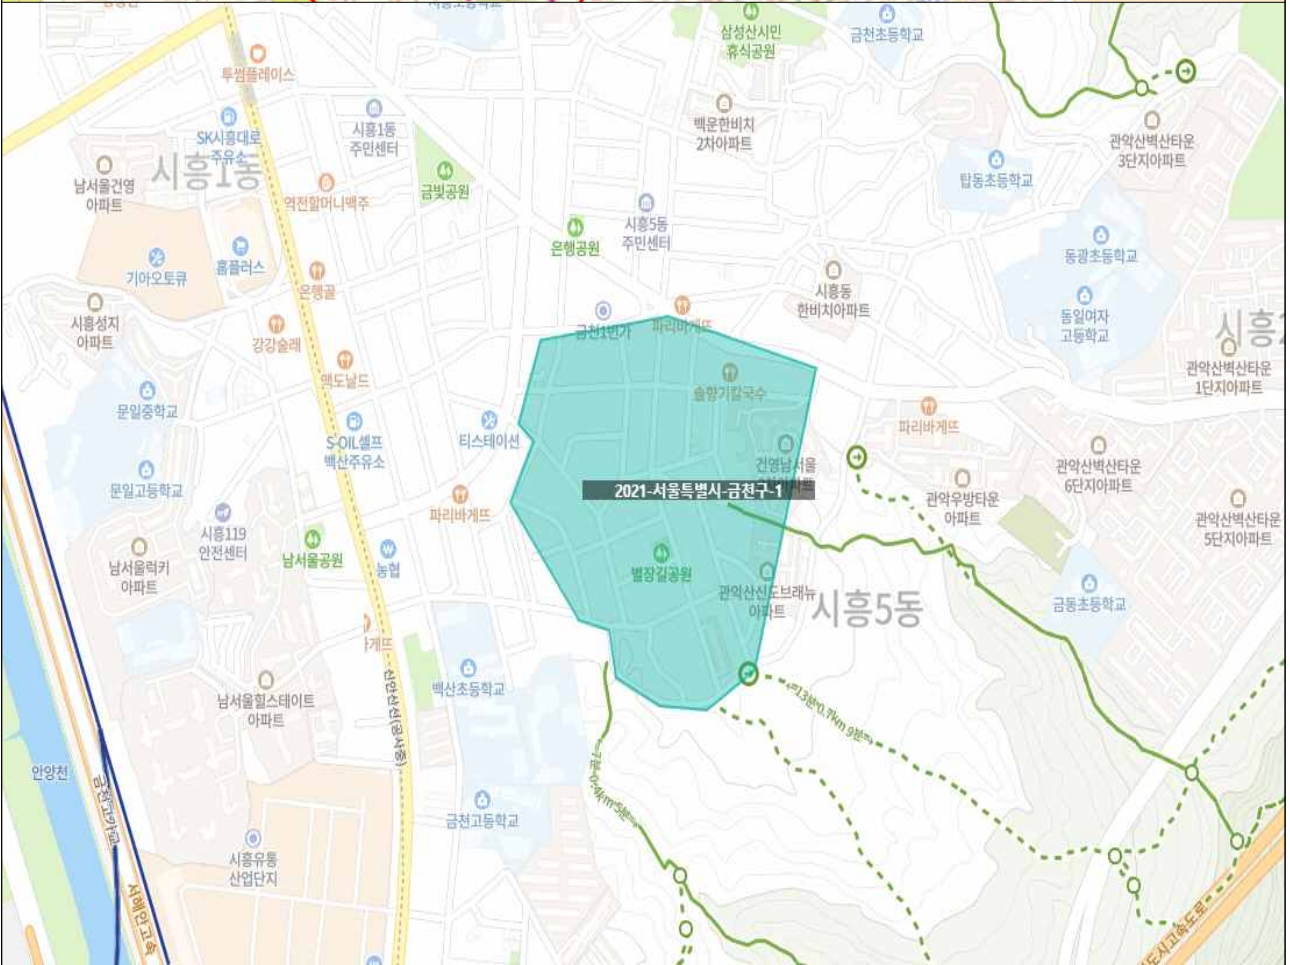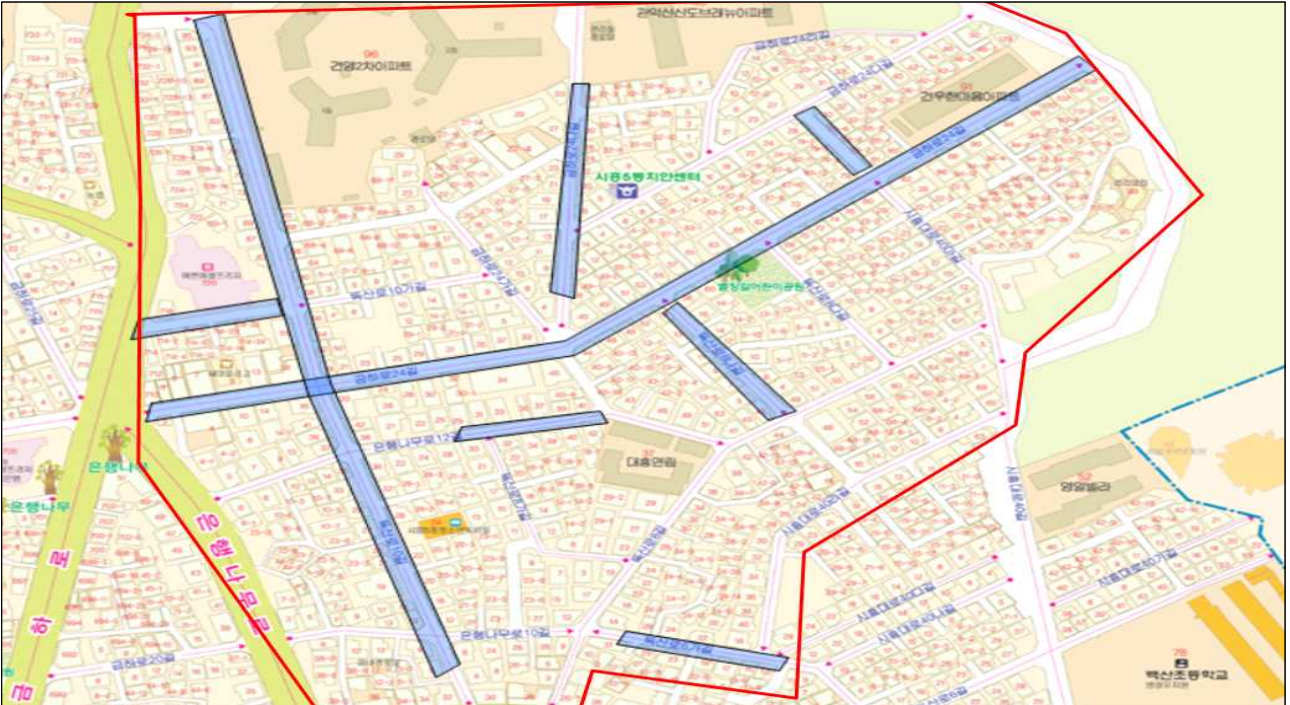

**【시흥5동 주 권역 (금하로24길 3~독산로8나길 45 일대)】**
